

Aide-mémoire

République Démocratique du Congo

Mission de soutien au processus de préparation à la REDD+, soutenu par le FCPF (P124072)

Du 04 au 11 octobre 2013

Introduction et remerciements¹

Du 4 au 11 octobre 2013, une équipe de la Banque Mondiale, composée de Laurent Valiergue (Expert Senior en Finance Carbone et chef de mission) et Etienne Benoist (Consultant), a effectué une mission d'appui au processus de préparation à la REDD+² en RDC.

La mission avait pour objectif :

- de comprendre les causes des retards importants dans le recrutement des experts de la CN-REDD dans le cadre de sa réorganisation décidée en janvier 2013, afin ;
- d'en déduire un plan d'actions correctives et une date objectif de fin de processus ;
- d'avancer rapidement vers la signature de l'accord de don relatif à l'allocation de fonds additionnels (5,2 million \$) validée par le Comité des Participants en août 2013 ;
- d'épauler la CN-REDD dans sa compréhension du Cadre Méthodologique du FCPF afin que la RDC puisse mieux faire valoir ses points de vue lors de la réunion du Groupe de Travail ad hoc, prévue à Oslo en octobre 2013 ;
- de faire le point sur la reprise de l'ER-PIN³ formellement présentée aux participants du fonds carbone du FCPF en juin 2013 (Paris) et qui doit être resoumise prochainement (décembre 2013 ou mars 2014 en fonction de la décision des participants du fonds carbone) ;
- d'assister la RDC dans le suivi - évaluation de ses activités pour être en mesure de produire les rapports d'activités dans les délais impartis tel que demandé par le Comité des Participants du FCPF (résolution de mars 2013).

La mission remercie toutes les personnes rencontrées pour la qualité et le contenu des échanges, et plus particulièrement Monsieur Vincent Kasulu, Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme (MECNT), Monsieur Benjamin Toirambe, Directeur du Développement Durable (MECNT), Monsieur Victor Kabengele, Coordonnateur National de la CN-REDD. L'annexe 1 présente la liste exhaustive de toutes les personnes rencontrées.

Conformément à la Directive de la Banque Mondiale relative à l'accès à l'information adoptée le 1^{er} juillet 2010, la Banque et la République Démocratique du Congo confirment leur accord pour que cet aide-mémoire soit rendu accessible au public.

1. Contexte

Le processus de préparation à la REDD+ correspond à la mise en place d'une « infrastructure » nationale (notamment le MNV⁴, le registre, pour ne citer que deux exemples), préparant à la vente de réductions d'émission,

¹ Une liste des acronymes est proposée en annexe 5

² Réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, gestion durable des forêts et conservation des forêts

³ ER-PIN: Emission Reductions Program Idea Note

⁴ MNV : acronyme français signifiant « Mesure, Notification, Vérification », souvent remplacé dans le langage courant par l'acronyme anglais MRV « Measurement, Reporting and Verification »

issues de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, dans un cadre sécurisé, respectueux des hommes et de leur environnement. La RDC est soutenue dans ce processus par le Fonds de Préparation du FCPF depuis 2009. La RDC fait partie du groupe des pays les plus avancés dans ce domaine, ce qui lui laisse entrevoir l'étape d'après, soit la possible signature d'un CAVRE⁵ avec le Fonds Carbone du FCPF. Des fonds additionnels lui sont néanmoins nécessaires pour finaliser son processus de préparation. C'est dans ce contexte que la RDC a sollicité en 2012 l'octroi d'une aide additionnelle de 5 millions de dollars.

En octobre 2012, lors de la treizième réunion du Comité des Participants du FCPF, le Comité a adopté une résolution (PC/13/2012/3) allouant un financement additionnel de 5 millions de dollars. Il a été demandé néanmoins à la RDC de resoumettre sa requête en tenant compte des observations émises par le Comité des Participants. Resoumise en juillet 2013, la requête portant sur le financement additionnel a été officiellement validée par le Comité des Participants du FCPF le 2 août 2013. Il convient désormais d'avancer rapidement vers la signature de l'accord de don. Les fonds disponibles (premier don de 3,4 millions de dollars) sont en effet très limités (solde disponible au 30 septembre 2013 : 963 053,24 \$ en sachant qu'une DRF⁶ est en cours de traitement pour un montant avoisinant les 300 000 \$). Tout retard dans la signature du deuxième accord de don pourrait entraîner des dysfonctionnements majeurs faute de moyens et des retards dans la finalisation du processus de préparation à la REDD+.

Une réorganisation de la CN-REDD a été décidée en janvier 2013 suite à la fin du programme ONU-REDD (décembre 2012) et à l'autoévaluation du processus REDD+ en RDC. Cette réorganisation devait être terminée en juin 2013. Elle est toujours en cours.

Le cadre méthodologique du FCPF est en cours de discussion. Ce cadre méthodologique précisera notamment les ajustements possibles en matière de scénario de référence. Quand on sait l'importance de l'impact du scénario de référence sur la valeur nominale d'un CAVRE, la RDC se doit de parfaitement maîtriser ce sujet pour mieux faire valoir son point de vue dans les discussions à intervenir.

2. Principaux résultats

Réorganisation de la CN-REDD

Malgré un processus de recrutement clarifié⁷ (voir annexe 3) lors de la mission d'avril-mai 2013, l'UC-PFCN⁸ n'a pas su terminer le processus de recrutement nécessaire à la réorganisation de la CN-REDD dans les délais escomptés. Onze postes auraient dû être pourvus au 30 septembre 2013 et ne le sont toujours pas (voir tableau ci-dessous).

⁵ CAVRE : Contrat d'Achat / Vente de Réductions d'Emission

⁶ DRF : Demande de Remboursement de Frais

⁷ Avaient été négocié en mai avec l'UC-PFCN un délai de 29 jours ouvrés entre le moment où les Termes de Référence d'un poste reçoivent la Non-Objection de la banque et le moment où l'UC-PFCN propose le contrat à la banque pour avis

⁸ UC-PFCN : Unité de Coordination du Projet « Forêt et Conservation de la Nature ».

		Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	
Coordonnateur							Contract			
Conseiller Technique Principal		TdR NO								
Chef de projet chargé de la diffusion de l'agenda REDD auprès des institutions nationales			TdR NO	→						
Assistant pour la diffusion de l'agenda REDD					TdR NO	→				
Expert National en Communication			TdR NO	→		CACM				
Assistant en communication					TdR NO	→				
Logisticien			TdR NO	→						
Assistant administratif			TdR NO	→						
Chef de projet chargé de la décentralisation de la REDD dans les provinces			TdR NO	→						
Secrétaire de Direction		" Si c'est le souhait du Coordonateur d'avoir une secrétaire de direction, pourquoi pas, mais je suugererai d' annuler le commis de bureau (R46) . Le financement de la masse salariale est un vrai probleme. On l'a vu dans la reprise de la erequete de fonds additionnels "					TdR NO	→		
Comptable					TdR NO	→				
Chef de projet national en charge de la Strategie		Cher Coordonateur, J'ai le plaisir de vous accorder la NO. La priorité est à la collecte des retours d'expérience issus des projets pilote pour nourrir les réflexions sur les autres activités et proposer des adaptations à la stratégie nationale, comme convenu en janvier 2013. Il n'est pas opportun en effet d'avoir un temps plein sur la stratégie . Une fois la personne recrutée, comme stipulé dans les TdRs, il conviendra de redéfinir tres précisément sa feuille de route.					TdR NO	→		
Expert National charge du Registre					TdR NO	→				
Points Focaux Provinciaux								TdR NO	→	
Expert National chargé de Niveau de référence et du MRV							TdR NO	→		
Techicienne de surface (R54)					TdR NO	→				

L'UC-PFCN a évoqué des problèmes de disponibilité de l'expert indépendant pour la tenue des commissions d'analyse pour justifier les retards constatés. Bruno Hugel (CN-REDD) devait jouer ce rôle initialement, mais suite à son départ en juin, il a fallu s'accorder sur un nouvel expert indépendant, un choix difficile pendant la période estivale. Philippe Duchochois (Conseiller du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme) a accepté de prendre la relève. Le processus est donc relancé.

Accord de don relatif aux fonds additionnels :

5 millions de dollars (résolution PC/13/2012/3) + 0,2 million de dollars (résolution électronique PC/Electronic/2012/1)

Afin d'avancer vers l'accord de don, deux points devaient être clarifiés avec les autorités congolaises :

- le Plan de Passation des Marchés (document détaillant la liste des activités et/ou fournitures devant faire l'objet d'un appel à la concurrence) ;
- les arrangements fiduciaires.

Plusieurs sessions de travail ont été nécessaires à la mise au point du Plan de Passation des Marchés. Ce dernier est présenté en annexe 2. Sur le don de 5,2⁹ millions de dollars, 62% des dépenses (3.22 millions de dollars) sera engagé sur la base d'appels à la concurrence.

La qualité des prestations fournies par l'UC-PFCN a été longuement débattue au cours de la mission, au sein du MECNT, mais aussi directement avec les intéressés. Le Ministère et la CN-REDD sont très critiques à son égard.

⁹ L'accord de don (5,2 millions de dollars) à intervenir combine les fonds alloués par la résolution PC/13/2012/3 en date d'octobre 2012 et ceux (200 000 dollars) dédiés aux mécanismes de plainte et de recours décidés par la résolution électronique PC/Electronic/2012/1.

Programme de réductions d'émission - Signature d'un CAVRE avec le fonds carbone du FCPF

Afin d'avancer rapidement vers la signature d'un CAVRE avec le Fonds Carbone du FCPF, la RDC a officiellement soumis à la 7ème réunion des participants du Fonds Carbone du FCPF, en juin à Paris, une Note d'Identification de Programme (NIP¹⁰). Bien accueillie, cette proposition doit cependant être révisée avant de pouvoir intégrer le portefeuille de projets du fonds. Le compte-rendu du président, présenté en annexe 4, précise les points d'amélioration attendus.

La zone du programme a été arrêtée en privilégiant une zone dans le bassin d'approvisionnement en charbon de bois et/ou bois de feu de Kinshasa, tout en prenant en compte l'existence et la qualité d'opérateurs de terrain susceptibles de développer des projets REDD+.


Les districts de Mai Ndombé et des Plateaux de la Province du Bandundu (zone en noire ci-dessous) répondent à ces critères¹¹. On y trouve WWF Carpo, ERA (Ecosystem Restoration Associates), WWC (Wildlife Works Carbon), des concessionnaires forestiers soucieux de la gestion durable de leurs concessions (SODEFOR) et des projets/expériences réussi(e)s¹² pouvant servir d'exemple et donc susceptibles d'accélérer la diffusion de bonnes pratiques respectueuses du couvert forestier.

Zone d'approvisionnement de Kinshasa en charbon de bois et/ou bois de feu



(carte Geoatlas)

Province du Bandundu

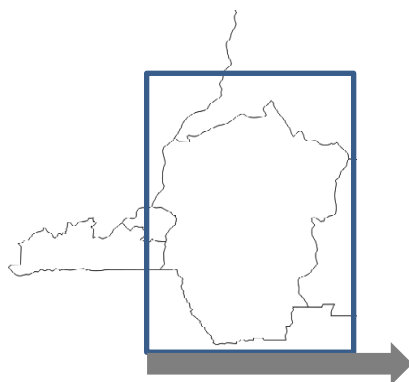

Zone du Programme



Le projet PIF¹³ intègre cette décision quant à la localisation du programme de réduction d'émission. Le projet PIF financera des activités dans la zone. Elles concourront à la production de réductions d'émission susceptibles d'être monétisées dans le cadre du CAVRE qui pourrait être signé avec le Fonds Carbone du FCPF.

La mission a pris part à des sessions de travail associant les partenaires de la RDC dans la conception de ce programme de réductions d'émission, que sont :

- ERA (Ecosystem Restoration Associates) ;
- WWC (Wildlife Works Carbon) ;
- WWF (World Wildlife Fund).

¹⁰ On utilise généralement plutôt l'acronyme anglais ER-PIN (Emission Reductions - Project Identification Note)

¹¹ Ces deux districts pourraient à terme constituer la future Province de Mai Ndombé dans le cadre de la loi sur la décentralisation

¹² Projet MDP d'Ibi, Projet de Mampu, Projet Makala

¹³ PIF: Programme d'Investissement Forestier

Des divergences de vues existent encore quant à la structure à mettre en place pour la gestion au jour le jour du programme. La RDC doit trancher rapidement sur ces débats afin de ne pas affaiblir la NIP révisée devant être resoumise aux participants du fonds carbone.

Etude Environnementale et Sociale Stratégique

L'Etude Environnementale et Sociale Stratégique (EESS), le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et les cinq cadres associés (Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones, Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel, Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides, Cadre Fonctionnel, Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire) sont disponibles. Sur la base de résumés, des consultations sont en cours dans les 11 provinces de la RDC pour recueillir les derniers commentaires ou recommandations avant la tenue d'un atelier national de validation prévu en janvier 2014.

La mission a discuté des modalités de prise en compte de ces commentaires ou recommandations issus des consultations en cours avant la tenue de l'atelier de janvier. Un comité technique sera constitué à cet effet. La banque mondiale y sera représentée pour s'assurer de la conformité du produit fini aux politiques de sauvegarde de la banque mondiale.

La mission a d'ores et déjà partagé avec la CN-REDD les commentaires de la banque sur les versions actuelles disponibles. Les documents doivent être repris à la marge pour satisfaire les standards de la banque avant diffusion.

Autres sujets

La mission a assisté la RDC dans la compréhension du Cadre Méthodologique du FCPF en cours de négociation, et plus particulièrement dans la compréhension des différentes options concernant les scénarios de référence. La RDC participera du 24 au 30 octobre à Oslo au groupe de travail dédié. Elle devra y faire valoir ses points de vue.

La mission a aussi assisté la RDC dans la mise en œuvre de la résolution (mars 2013) du Comité des Participants du FCPF traitant du suivi et évaluation de ses activités. Chaque année, les pays REDD+ bénéficiant d'un don de préparation du FCPF doivent produire pour le 20 septembre un rapport détaillant leurs progrès selon un format nouvellement arrêté.

La mission a également rencontré les partenaires (Programme ONU-REDD, Ambassade Royale de Norvège) pour s'assurer de la cohérence des actions.

3. Accords conclus au cours de la mission

Organisation

1. L'UC-PFCN s'est engagé à finaliser le processus de recrutement au 20 octobre 2013. La finalisation du processus de recrutement inclut la tenue des réunions des commissions ad hoc et les propositions à la banque mondiale pour non objection du candidat retenu pour chacun des postes ;
2. Le recrutement du logisticien, des 2 chauffeurs et de la technicienne de surface utiliseront la procédure simplifiée de comparaison des CVs à mener par le Coordonnateur de la CN-REDD avec son homologue de l'UC-PFCN.
3. Date objectif de signature de tous les contrats : 1^{er} novembre 2013.

Demande de fonds additionnels

1. Collégalement, la RDC et la Banque mondiale ont décidé de faire leurs meilleurs efforts pour viser une signature de l'accord de don en décembre 2013 ;

- La RDC souhaite sortir de sa dépendance vis-à-vis de l'UCP-PFCN quant à la gestion financière et fiduciaire du don FCPF. Le MECNT gèrerait directement les fonds sous réserve de capacités avérées.

Programme de réductions d'émission - Signature d'un CAVRE avec le fonds carbone du FCPF

- La RDC doit rapidement clarifier le modèle de structure de gestion envisagée pour son programme de réductions d'émission dans la Province du Bandundu ;
- Révision de la NIP sur la base d'une structure de gestion clarifiée, de l'évolution du cadre méthodologique (scenario de référence) et des commentaires des participants du fonds carbone émis lors de la réunion de juin 2013 (Cf. annexe 4).

4. Prochaines étapes

Activité	Action	Date objectif de fin de réalisation
Organisation		
Finalisation du processus de recrutement par l'UC-PFCN	Réunion des commissions ad hoc et proposition des candidats retenus à la banque mondiale pour non objection	20 octobre 2013
Signature des contrats avec les candidats retenus	Rédaction des contrats	1 novembre 2013
Demande de fonds additionnels		
Signature de l'Accord de Don	Due diligence de la banque mondiale et négociation du contrat	15 décembre 2013
EESS – CGES et cadres associés		
Retour de la CN-REDD sur les commentaires de la banque mondiale	Prise en compte des commentaires de la banque mondiale dans les versions actuellement disponibles	30 octobre 2013
	Discussions sur des points éventuels de désaccord avec reprise des documents sur la base d'un compromis satisfaisant les deux parties (Banque mondiale et CN-REDD)	15 novembre 2013
Consultations provinciales	Réunion du Comité Technique pour revue des commentaires ou recommandations issus des consultations provinciales pour prise en compte dans les versions finales à présenter lors de l'atelier de validation	15 janvier 2013
Validation	Atelier national	30 janvier 2013
Programme de réductions d'émission - Signature d'un CAVRE avec le fonds carbone du FCPF		
Entité gestionnaire du programme de réductions d'émission	La RDC doit trancher quant aux différends opposant ses partenaires	30 octobre 2013
Révision de la NIP	Traiter dans la NIP révisée tous les points soulevés par les participants du Fonds Carbone du FCPF lors de la réunion de juin 2013	Prochaine réunion des participants du fonds Carbone
Suivi – évaluation des activités		
Rapports	Finaliser et envoyer au FCPF les rapports d'activités conformément au modèle nouvellement arrêté	16 octobre 2013


Liste des personnes rencontrées au cours de la mission

Prénom – Nom	Organisation - Titre
Instances Nationales	
Vincent Kasulu	MECNT - Secrétaire Général
Benjamin Toirambe	MECNT – Directeur Développement Durable
Victor Kabengele	CN-REDD - Coordonnateur National
Clément Vangu	CN-REDD - Coordonnateur PIF
Benjamin Mandjo	CN-REDD – Assistant national PIF
Marc Rodriguez	CN-REDD – Assistant international PIF
Rubin Rashidi	CN-REDD – Expert social & environnemental (PNUE)
Gilbert Atanda	CN-REDD– Chargé de Programme ONU-REDD / FAO
Leslie Ouarzazi	CN-REDD - Conseiller Technique ONU-REDD / PNUD
Martin Lukaya	UC-PFCN - Coordonnateur
Etienne Mbula	UC-PFCN – Directeur Financier
Donat Kalombo	UC-PFCN – Chargé de passation de marchés
Jose Mbanzulu	UC-PFCN
Partenaires	
Josep Gari	ONU-REDD - Conseiller Régional Afrique
Jostein Lindland	Ambassade Royale Norvégienne – Coordonnateur Régional
Autres acteurs	
Tracy Johns	Wildlife Works
Jean-Robert Bankanza	Ecosystem Restoration Associates (ERA)
Mike Korshinsky	Wildlife Works
Bruno Perodeau	WWF RDC
Flory Botamba	WWF RDC
Raymond Lumbuenamo	WWF RDC

Plan de Passation des Marchés

	Monthly price (\$)	Price over the grant period	Acquisition type	Date of the contract signature
Component 1: Support to the coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-stakeholder Consultations		580,000		
1.1 Coordination of the REDD+ Readiness Process		0		
1.2 Promotion of multi-stakeholder consultations		580,000		
Services (outreach about REDD+) provided by GTCR		40,000	Firm	Mar-14
Services (outreach about REDD+) provided by REPALF		20,000	Firm	Mar-14
Communication tools (design and editing)		200,000	Firm / Individual	Jun-14
Services provided by GLOBE aiming at training politicians		70,000	Firm	Mar-14
Consultancy services to design REDD+ friendly sectoral policies		110,000	Individual	Apr-14
Legal expertise for the review of the legal framework		140,000	Individual	Sep-14
Component 2: Contribute to the design of a National REDD+ strategy		495,000		
2a Preparation of the national strategy		0		
2b Preparation of the implementation framework		295,000		
High-level IT services to finalize the registry		195,000	Firm	Jan-14
High-level IT services to set up a Feedback, grievance and redress mechanism		100,000	Firm	Jan-14
2c Strategic Environmental and Social Assessment		200,000		
High-level IT services to develop the SIS		100,000	Firm	Jan-14
Consultancy services to design the Benefit Sharing Plan related to the ER-Program in the Bandundu Province		100,000	Firm	Jan-14
Component 3: Preparation of a National Reference Scenario for REDD+		2,145,200		
Component 4: Project Management				
4.1 CN-REDD consultant fees over a 28.93 month period (bearing in mind that FCPF 1 funding will cover the costs over a 7.07 month period)		1,513,200		
National REDD+ Coordinator	6,000	173,562	Individual	May-14
Coordinator Deputy	11,000	318,196	Individual	Apr-14
Assistant to the Coordinator	2,100	60,747	Individual	Apr-14
Secretary	1,200	34,712	Individual	Apr-14
Logistician	1,200	34,712	Individual	Apr-14
Cleaning lady	593	17,157	Individual	Apr-14
Driver (1)	760	21,984	Individual	Apr-14
Driver (2)	758	21,927	Individual	Apr-14
Decentralization leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
Politics and legal framework adaptation (PLFA) leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
Assistant to the PLFA	2,100	60,747	Individual	Apr-14
Registry leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
MRV-REL-RL leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
Information, Education and Communication (IEC) leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
Assistant to the IEC leader	2,100	60,747	Individual	Apr-14
Project Monitoring & Evaluation leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
SESA leader	3,500	101,244	Individual	Apr-14
Focal Point 1	1,427	COMIFAC		
Focal Point 2	1,427	COMIFAC		
Focal Point 3	1,427	COMIFAC		
Focal Point 4	1,427	COMIFAC		
Focal Point 5	1,427	COMIFAC		
4.2 Financial management and procurement, including external audits		337,000		
Procurement specialist (2 years)	3,000	72,000	Individual	Jul-14
Accountant (2 years)	2,500	60,000	Individual	Jul-14
Services provided by CU-FNCP (1 year)		85,000	Firm	Dec-13
External financial audits		120,000	Firm	Feb-15
4.3 Operational expenditure (OPEX)		240,000		
Office rental		240,000	Firm	Dec-13
4.4 Support to the Ministry of Environment, Nature Conservation and Tourism		0		
4.5 Equipment		55,000		
Vehicle purchase		55,000	Furniture	Dec-13
Total		3,220,200		

Processus de recrutement des agents de la CN-REDD et Composition de la Commission d'Analyse et du Comité des Marchés

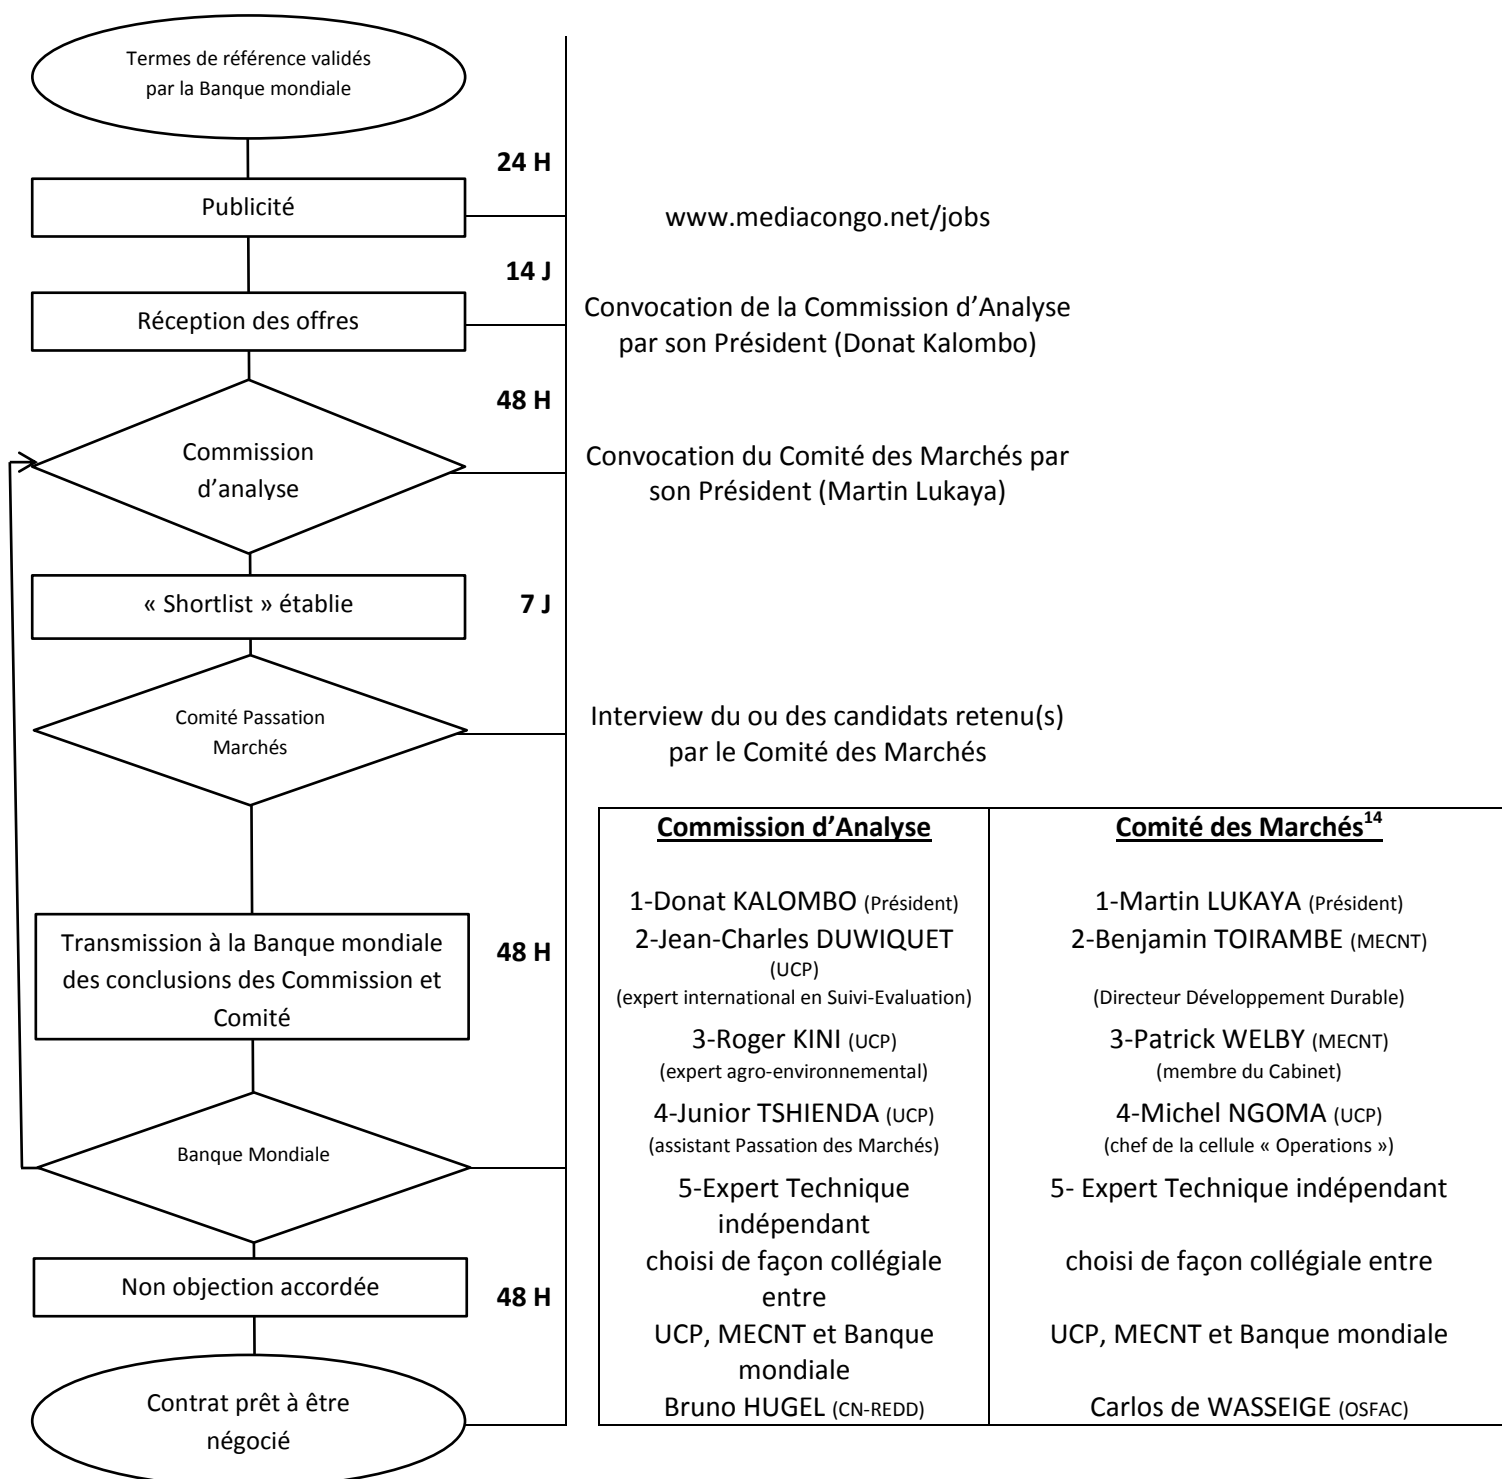

¹⁴ Donat KALOMBO, en tant que Chef de la Cellule "Passation des marchés" assistera aux réunions du Comité des marchés, sans voix délibérative néanmoins

**Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
Carbon Fund
Seventh Meeting (CF7)
Paris, France, June 24-25, 2013
Chair's Summary**

Presentation of the ER-PIN for Democratic Republic of Congo

- The Democratic Republic of Congo (DRC) presented its ER-PIN for consideration by Carbon Fund Participants. CFPs noted the high quality of the ER-PIN as well as the strong government commitment to the proposed program and to REDD+. CFPs further acknowledged the opportunity that the program presents to demonstrate that REDD+ can be implemented at scale in Sub-Saharan Africa.
- CFPs expressed interest in working further with DRC towards potentially including the ER-PIN in the pipeline of the Carbon Fund, raising several issues that will need to be addressed before full consideration, including:
 - ✓ The need for a better description and explanation of the approach used to set Reference Levels, in particular for degradation;
 - ✓ Description of the planned institutional set up for the National Fund, and information on how funds would channel down to local communities;
 - ✓ Description of the composition of the *Comité de Direction*.
 - ✓ Better explanation of how the proposed program would address the identified drivers of deforestation, in particular drivers related to small-scale agricultural expansion, charcoal production and mining, and how benefit-sharing would be aligned with the activities proposed to address these drivers;
 - ✓ Description of the status of ongoing land tenure reform;
 - ✓ Detail on how potential associated institutional capacity challenges will be overcome, given that the program target area, Mai Ndombe, is not yet a “politically operational” province¹⁵; and
 - ✓ Description of improved stakeholder participation in the design of the program, including at the ER-PIN stage.
- CFPs noted that the updated Mid-term Report, which is expected to be submitted in the next few weeks, will provide important context on governance aspects related to REDD+.
- CFPs were made aware of concerns from civil society on potential challenges with registration of REDD+ projects in the DRC pursuant to the recent ministerial order on the accreditation procedures for REDD+ Projects (*Arrêté ministerial No 004/CAB/MIN/ECN-T/012 du 15 Feb 2012 fixant la procédure d'homologation des projets REDD+*).
- The DRC clarified in response that: i) provincial boundaries are not expected to change during the term of a potential ERPA as the country is rolling out the re-organization of provinces slowly, ii) a governance matrix has recently been defined to help improve the investment climate, iii) the ministerial order will be reviewed according to the outputs of the ongoing Social and Environmental Assessment (SESA) process, and iv) additional donor funding would be welcome to cover the cost of investment activities that aim to reduce deforestation.
- Generally, CFPs recommended that all countries include in their ER-PINs a short explanation of how their proposal fits with the overarching guidance provided by the emerging Methodological Framework.

¹⁵ As per the 2006 Constitution, the DRC is to increase the current number of 11 provinces to 26 provinces. The proposed program area corresponds to one of the new provinces that has not yet been established and currently forms part of a larger province.

Follow up action: The DRC is expected to revise the ER-PIN based on the feedback provided by the CFPs with the aim of resubmitting the document for consideration at the next CF meeting.

Annexe 5

Liste des Acronymes utilises

CAVRE	Contrat d'Achat / Vente de Réductions d'Emission
CGES	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CN-REDD	Coordination Nationale REDD
CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
EES	Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique
ERA	Ecosystem Restoration Associates
ER-PIN	Acronyme anglais : « Emission Reduction - Project Idea Note »
FCPF	Fonds de Partenariat du Carbone Forestier
MDP	Mécanismes de Développement Propre
MECNT	Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme
MNV	Mesure, Notification, Verification
MRV	Acronyme anglais « Measurement, Reporting, Verification »
NIP	Note d'Identification de Projet
PIF	Programme d'Investissement Forestier
PPM	Plan de Passation des Marchés
PTBA	Plan de Travail, Budget Annuel
REDD+	Réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, gestion durable des forêts et conservation des forêts
REDD	Réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts
VCS	Verified Carbon Standard
WWC	Wildlife Works Carbon
WWF	World Wildlife Fund
